



PROJETO
REORGANIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS
COMPARTILHADAS
SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA

PROJETO: Reorganização das estruturas compartilhadas


Objetivos:

- Atender as solicitações das municipalidade;
- Reduzir a poluição visual nos municípios;
- Aumentar a segurança da população;
- Reduzir o tempo de realização das atividades técnicas da concessionária;
- Melhorar a imagem das empresas.

Como?

Através de mutirões a serem desenvolvidos com as empresas de telecomunicações. Atualmente estamos na Fase 2 dos mutirões nas cidades de Porto Alegre e Viamão.

PROJETO: Reorganização das estruturas compartilhadas

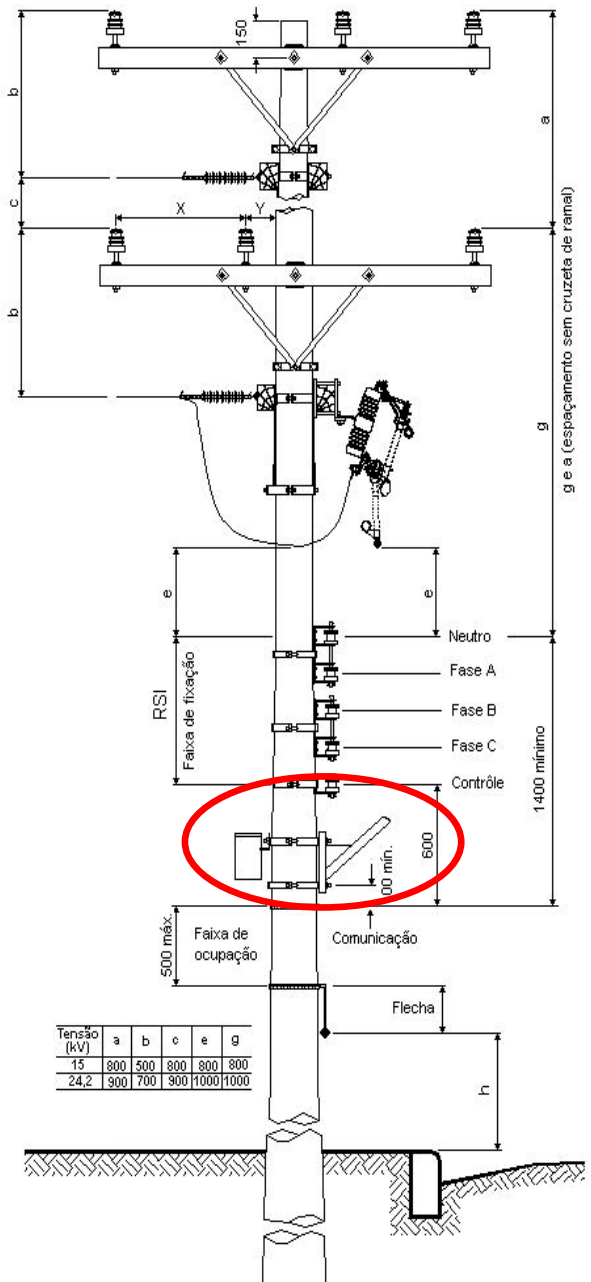

PROJETO: Reorganização das estruturas compartilhadas – Mutirão Fase 1 (resultados)

Cronograma:

FISCALIZAÇÃO	Início	Término
Porto Alegre - Av. Francisco Silveira Bitencourt		
Inspeção	17/09/2021	24/09/2021
Ação de Higienização de cabos e equipamentos inativos	21/09/2021	01/10/2021
Notificação de cabos e equipamentos sem autorização	04/10/2021	05/10/2021
Retirada de cabos e equipamentos sem autorização	28/10/2021	05/11/2021
Guaíba - Av. Nestor de Moura Jardim		
Inspeção	17/09/2021	24/09/2021
Ação de Higienização de cabos e equipamentos inativos	21/09/2021	01/10/2021
Notificação de cabos e equipamentos sem autorização	04/10/2021	05/10/2021
Retirada de cabos e equipamentos sem autorização	28/10/2021	05/11/2021

PROJETO: Reorganização das estruturas compartilhadas – Resultados da Fase 1

Mutirão: Av. Nestor de Moura Jardim, Guaíba.

Equipes:

- CEEE Equatorial Energia com caminhão cesto para apoio na rede de energia elétrica.
- Compartilhantes com capacidade de execução da retirada de cabos e readequação das instalações.

Resultado: 400kg de sucata recolhida pela empresa.



PROJETO: Reorganização das estruturas compartilhadas – Resultado da Fase 1

Início



Dia 21/09/2021, 8h.



Dia 29/10/2021, 11h.

PROJETO: Reorganização das estruturas compartilhadas – Resultados da Fase 1



Dia 04/10/2021, 11h.



Dia 29/10/2021, 11h.

PROJETO: Reorganização das estruturas compartilhadas – Resultados da Fase 1



Dia 29/10/2021, 11h.

PROJETO: Reorganização das estruturas compartilhadas - Resultados da Fase 1

Constatação: 12/11/2021.



PROJETO: Reorganização das estruturas compartilhadas – Fase 3

Cronograma:

Mutirões Fase 3		
Eldorado do Sul - R. Emancipação	Início	Término
Inspeção	18/11/2021	24/11/2021
Ação em campo (Higienização e corte)	01/12/2021	10/12/2021

OBS: A comunicação ocorre através do Portal CEEE Equatorial Energia (<https://ceee.equatorialenergia.com.br/compartilhamento-de-infraestrutura>) e Notificações.

PROJETO: Reorganização das estruturas compartilhadas – Fase 2

Participantes:

- CEEE Equatorial Energia com caminhão cesto para apoio na rede de energia elétrica.
- Compartilhantes com capacidade de execução da retirada de cabos e readequação das instalações.

O que se espera encontrar no momento do mutirão:

- a) Cabos e estruturas inativas não identificados já retirados;**
- b) Pontos de ocupação já identificados em todos os vãos;**
- c) Cabos e fibras fixos em seus devidos suportes e afastamento mínimo de 1,40m do neutro da BT;**
- d) Cabos e fibras agrupados em um único ponto de ocupação por grupo econômico;**
- e) Tração, altura e posicionamento das fibras e cabos adequados tecnicamente.**

OBS: O material retirado deve ser descartado pelas compartilhantes.

PROJETO: Reorganização das estruturas compartilhadas – Fase 2

Constatação: Av. Bento
Gonçalves, Porto Alegre.



PROJETO: Reorganização das estruturas compartilhadas – Fase 2

Onde vamos estar?



Dia 01/12/2021, 8h.

PROJETO: Reorganização das estruturas compartilhadas

Contato: analiseprojeto@ceee.com.br
compartilhamento@ceee.com.br

GRUPO
equatorial
ENERGIA

equatorialenergia.com.br
